

両荘みらい学園建設工事の進捗状況について

1 建設工事スケジュール（予定）[学校敷地内分]


■は現在工事中 ■は工事完了

年	令和4年					令和5年												令和6年		
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
①教室棟	■																			
②特別教室棟	■ 東側部分										■ 西側部分									
③図書室・公民館棟											■									
④エレベーター棟	■																			
⑤管理教室棟	■ 2階の一部										■ 残りの部分									
⑥職員室棟											■									
⑦体育館			■																	
⑧武道場						■														
⑨駐輪場						■														

(注) 開校後、令和6年12月末まで、現在の両荘公民館の解体工事及び外構工事を行います。

2 工事概要

- ①教室棟（増築）
- ②特別教室棟（改修）
- ③図書室・公民館棟（増築）
- ④エレベーター棟（増築）
- ⑤管理教室棟（改修）
- ⑥職員室棟（増築）
- ⑦体育館（改修）
- ⑧武道場（改修）
- ⑨駐輪場（増築）

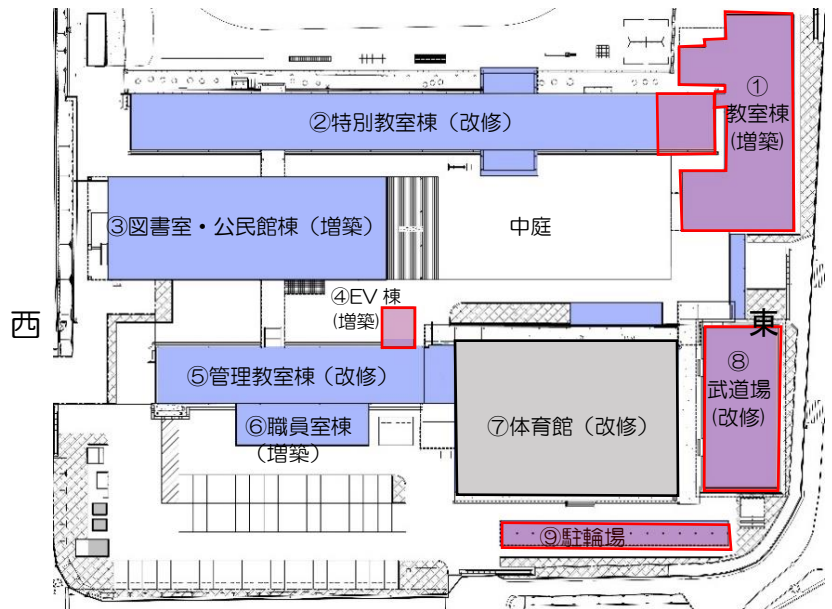

■は現在工事中 ■は工事完了

(裏面に続く)

参 考



①教室棟増築部の鉄骨工事



①教室棟増築部の内部状況



⑦体育館の外壁改修（1月末完成）



⑦体育館の床改修（1月末完成）



⑧武道場床改修（2月現在）



③図書室イメージ図
