

加古川市新クリーンセンター解体撤去工事

工事近況報告

発注者：加古川市

監理者：(株)環境技術研究所

施工者：三井住友建設(株)
加古川クリーンセンター作業所
〒675-1224
加古川市平荘町上原4-1
加古川市新クリーンセンター内
TEL:079-451-6273

令和5年2月


【工事概要】

- 工事名称：加古川市新クリーンセンター解体撤去工事
- 工事場所：加古川市平荘町上原4-1
- 工期：令和4年5月26日～令和6年3月15日
- 施工者：三井住友建設株式会社



【現在の施工状況】

ダイオキシン類対策仮設・付着物除去工事

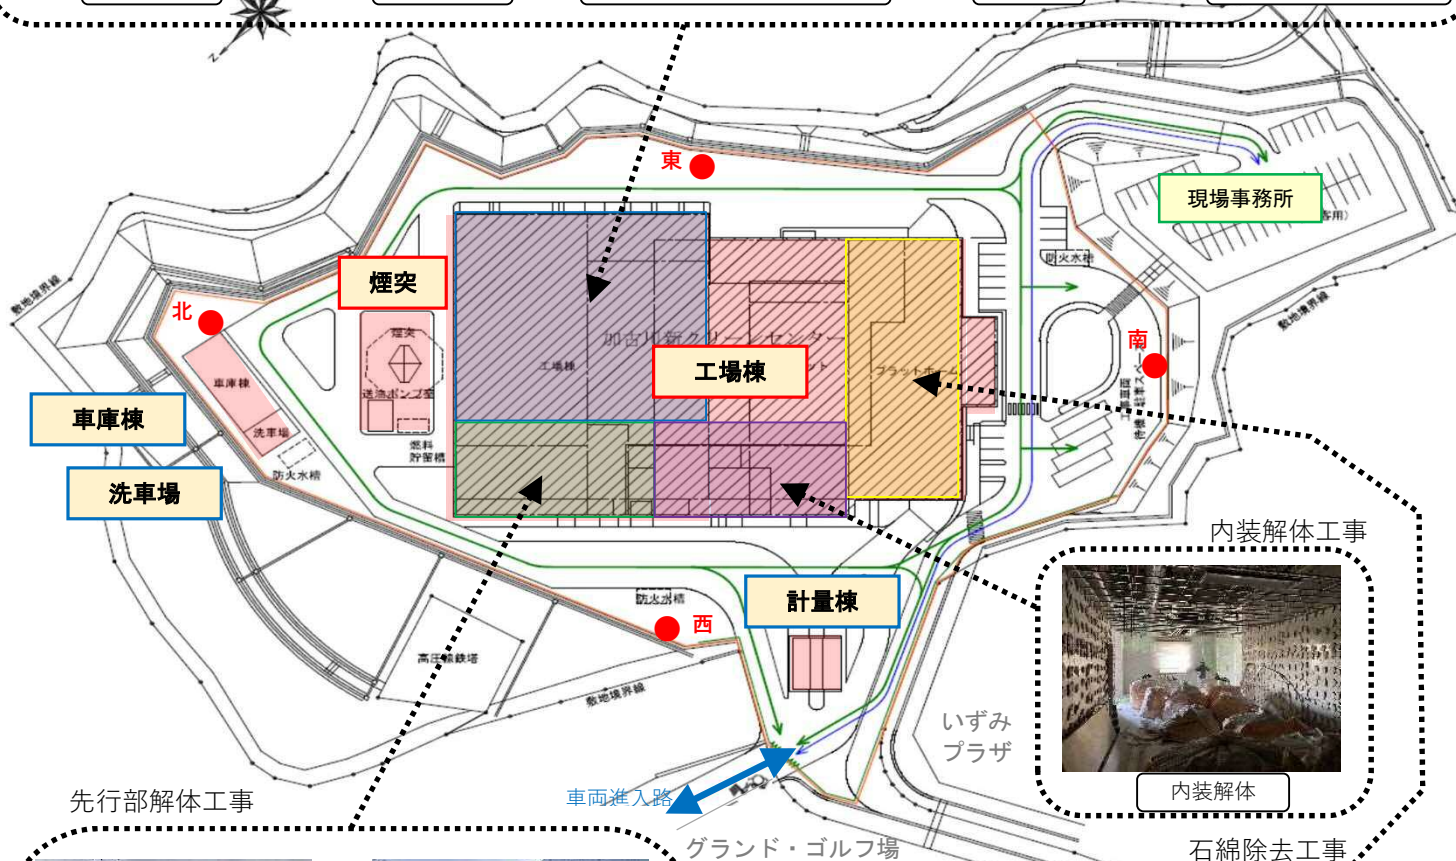

【工事前大気測定結果】

- ダイオキシン類・アスベスト・粉じんの工事前測定結果を下に示します。測定位置は、平面図の●のところ。いずれの値も基準値を下回っております。

【ダイオキシン類】			【アスベスト】			【浮遊粒子状物質：粉じん】		
単位：pg-TEQ/m ³			単位：本/ℓ			単位：mg/m ³		
調査地点	測定値	環境基準値	調査地点	測定値	基準値	調査地点	測定値	環境基準値
東	0.013	0.6	東	0.5未満	10	東	0.019	0.2
西	0.013		西	0.5未満		西	0.021	
南	0.016		南	0.5未満		南	0.021	
北	0.013		北	0.5未満		北	0.020	


工事中の測定結果については、工程の進み具合に応じて順次お知らせします。

【火災消火水の取り扱い】

- 12月3日(土)、ごみピット内部で火災を発生させてしまい、皆様にはご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。火災の消火水は、現在もごみピット内に貯留されており、水処理したのち、2月中旬から下水道へ放流します。

【付着物除去工事】（ダイオキシン類付着物除去工事）

- わずかな隙間も養生等により密閉し、外部区域と隔離・分離して、負圧集塵機で作業場所を負圧に保った状態として、高圧水によるジェット洗浄でダイオキシン類付着物を徹底的に除去する作業です。内部を負圧化することで、粉じん等の外部への拡散防止を図ります。
- 付着物の清掃・除去に使用した高圧洗浄水は、仮設排水処理装置でダイオキシン類を除去したあと循環使用し、最後は産業廃棄物として処理します。
- 2/13(月)から「ダイオキシン類付着物除去工事」の準備を始めています。

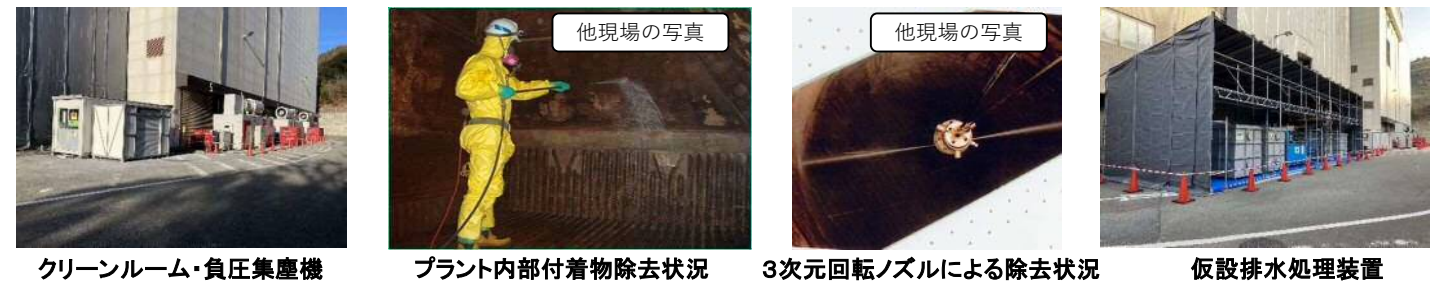

【作業時間】

- 作業時間の変更
8：00～19：00
※敷地境界に設置した振動・騒音計の値に配慮しながら作業を行います。

